PENGEMBANGAN FITUR DASHBOARD PADA SISTEM PROJECT MANAGEMENT BERDASARKAN DATA DAILY REPORT

(Studi Kasus : PT Smart Home Inovasi Yogyakarta)

LAPORAN TUGAS AKHIR

DIAN PUTRI ISWANDI

5220311118

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI PROGRAM SARJANA

FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA

2026

PENGEMBANGAN FITUR DASHBOARD PADA SISTEM PROJECT MANAGEMENT BERDASARKAN DATA DAILY REPORT

(Studi Kasus : PT Smart Home Inovasi Yogyakarta)

Disusun oleh

DIAN PUTRI ISWANDI

5220311118

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal ……

DEWAN PENGUJI

Nama & Gelar	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
……. NIK.	Ketua Penguji	…….	……..…
……. NIK.	Penguji I	…….	……..…
……. NIK.	Penguji II (Dosen Pembimbing)	…….	……..…

Yogyakarta, ……
Ketua Program Studi Sistem Informasi

…….

NIK.

LEMBAR PERNYATAAN

SURAT KETERANGAN TUGAS AKHIR

KATA PENGANTAR

ABSTRAK

ABSTRACT

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Smart Home Inovasi Yogyakarta (SHI), yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan perusahaan teknologi yang mengkhususkan diri pada pengembangan solusi Smart Home dan *Internet of Things* (IoT). Mengusung visi sebagai penyedia solusi hunian cerdas terdepan, SHI menghadirkan inovasi perangkat otomasi—mulai dari sistem keamanan, pengaturan suhu, hingga efisiensi energi—guna menciptakan ekosistem hunian yang aman, nyaman, dan hemat energi. Secara operasional, proses bisnis perusahaan dimulai dari penerimaan pesanan klien, dilanjutkan dengan survei lokasi, perencanaan desain sistem, pelaksanaan instalasi perangkat, integrasi antar-komponen, hingga pengujian dan serah terima proyek kepada pelanggan. Untuk menunjang kegiatan operasional tersebut, SHI telah mengimplementasikan sebuah aplikasi manajemen proyek yang mencakup fungsi pengelolaan data proyek, penjadwalan, penugasan teknisi, serta pencatatan laporan harian (*daily report*) sebagai acuan utama dalam memantau kemajuan fisik dan kondisi aktual proyek di lapangan.

Meskipun aplikasi manajemen proyek memiliki fitur daily report, sistem hanya dapat diakses manajer sehingga teknisi lapangan harus melaporkan secara tidak langsung. Selain itu, tidak ada visualisasi dashboard untuk ringkasan kondisi seluruh proyek. Akibatnya, tanpa indikator risiko terukur, manajer sering mengabaikan proyek kritis dan deteksi masalah menjadi lambat (reactive). Hal ini berdampak pada penurunan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi berupa pengembangan fitur dashboard pada aplikasi manajemen proyek yang telah berjalan di PT SHI. Pengembangan ini mencakup dua aspek utama, yaitu pemberian akses sistem kepada teknisi lapangan untuk menginputkan data daily report secara langsung, serta pembuatan fitur dashboard dengan kemampuan *smart system*. Fitur dashboard yang

dikembangkan memiliki kemampuan otomasi berupa kategorisasi status kesehatan proyek (Project Health Status) yang bekerja dengan cara sistem secara otomatis menghitung persentase progres ideal berdasarkan posisi hari berjalan terhadap total durasi proyek, kemudian membandingkannya dengan persentase realisasi aktual yang diinputkan oleh teknisi. Hasil perbandingan tersebut secara otomatis divisualisasikan dalam bentuk indikator kode warna pada tampilan dashboard, sehingga manajer dapat mengidentifikasi kondisi kesehatan setiap proyek secara sekilas. Pendekatan serupa telah dibuktikan efektivitasnya oleh Ernawan (2024) dalam penelitiannya pada perusahaan konstruksi, di mana implementasi dashboard manajemen mampu membantu eksekutif memantau indikator kinerja proyek secara real-time serta meningkatkan akurasi data untuk keperluan pemantauan.

Melalui implementasi fitur dashboard ini, diharapkan alur pelaporan dari teknisi lapangan ke manajer menjadi lebih lancar karena teknisi dapat menginputkan data daily report secara langsung ke dalam sistem tanpa perantara. Dengan visualisasi status kesehatan proyek, manajer dapat melakukan deteksi dini terhadap kondisi keterlambatan secara sekilas tanpa harus memeriksa laporan satu per satu. Secara keseluruhan, pengembangan ini diharapkan dapat membantu PT SHI memantau jalannya proyek dengan lebih efisien serta meminimalisir risiko keterlambatan penyelesaian proyek.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana merancang fitur *dashboard* yang mampu mengolah data *daily report* menjadi visualisasi status proyek yang mudah dipahami guna membantu manajer proyek dalam menentukan prioritas penanganan masalah secara objektif di PT Smart Home Inovasi Yogyakarta?

1.3 Batasan Masalah

1. Data yang diolah dalam sistem terbatas pada data *daily report* yang mencakup nama proyek, tanggal laporan, persentase progres harian, dan catatan kendala, serta data *baseline* jadwal proyek (tanggal mulai dan target selesai).

2. Sistem menghitung deviasi progres dengan membandingkan persentase realisasi aktual dari *daily report* terhadap progres ideal berdasarkan *baseline* jadwal, tanpa menggunakan metode prediksi berbasis *machine learning* atau kecerdasan buatan.
3. Sistem secara otomatis mengkategorikan status kesehatan proyek (*Project Health Status*) ke dalam beberapa kategori berdasarkan nilai deviasi, serta mengurutkan proyek berdasarkan tingkat urgensi pada tampilan dashboard.
4. *Output* sistem berupa fitur dashboard yang menampilkan ringkasan proyek aktif dengan indikator kode warna (hijau, kuning, merah), serta detail progres aktual, progres ideal, deviasi, dan catatan kendala terakhir.
5. Pengguna sistem terdiri dari Manajer Proyek sebagai pemantau dashboard dan Teknisi Lapangan sebagai penginput data *daily report*.
6. Sistem tidak mencakup pengelolaan data di luar lingkup *daily report*, seperti data keuangan, pengadaan material, atau manajemen sumber daya manusia.

1.4 Tujuan Penelitian

Merancang dan mengembangkan fitur dashboard pada sistem *project management* yang mampu mengolah data *daily report* secara otomatis menjadi indikator visual status kesehatan proyek (*Project Health Status*) di PT SHI.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Meningkatkan objektivitas pengambilan keputusan di PT SHI, di mana manajer proyek dapat menentukan prioritas penanganan proyek berdasarkan indikator visual yang terukur, bukan lagi berdasarkan intuisi atau penilaian subjektif.
2. Mempercepat identifikasi proyek bermasalah di PT SHI, karena sistem secara otomatis menonjolkan proyek dengan status kritis ke urutan teratas dashboard, sehingga potensi keterlambatan fatal pada proyek instalasi dan integrasi sistem *Smart Home* dapat dideteksi lebih dini dan ditangani secara preventif.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, batasan masalah yang menjadi lingkup pengembangan

sistem, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi PT SHI, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

Bab ini memuat kajian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengembangan dashboard dan sistem manajemen proyek sebagai referensi perbandingan, serta landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan dan pengembangan sistem.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam proses pengembangan sistem, termasuk tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak yang diterapkan, serta gambaran obyek penelitian yaitu PT SHI.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas analisis kebutuhan sistem serta perancangan sistem yang meliputi perancangan model proses, perancangan model data, perancangan fisik basis data, perancangan relasi antar tabel, dan perancangan antarmuka pengguna (*user interface*).

BAB V IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM

Bab ini menyajikan hasil implementasi sistem yang mencakup implementasi basis data dan implementasi antarmuka, dilanjutkan dengan pembahasan hasil sistem yang meliputi pembahasan basis data, pembahasan fungsionalitas sistem, pengujian sistem, serta inovasi sistem yang dikembangkan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah serta saran untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

BAB II
KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Hasil Penelitian

Kajian hasil penelitian ini memuat tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengembangan fitur dashboard pada sistem *project management*. Penelitian-penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk memahami pendekatan, metode, serta hasil yang telah dicapai oleh peneliti sebelumnya. Melalui kajian ini, dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis, sehingga dapat diketahui posisi dan kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan keilmuan di bidang sistem informasi manajemen proyek.

Penelitian yang dilakukan oleh Azkia dkk. (2024) dengan judul "*Perancangan Dashboard Monitoring dan Controlling Kinerja Proyek pada PT. XYZ Menggunakan Metode Agile and Lean Development*" menyoroti permasalahan keterlambatan dan pembengkakan anggaran pada proyek konstruksi telekomunikasi yang disebabkan oleh tidak adanya alat *monitoring* dan kontrol informasi yang efektif. Penelitian ini bertujuan merancang *dashboard monitoring* dan *controlling* kinerja proyek menggunakan metode *Agile and Lean Development* dengan mengintegrasikan konsep *Earned Value Management* (EVM) sebagai alat pengukuran kinerja. Dashboard yang dihasilkan mencakup tujuh fitur utama yaitu *Project Overview, Financial Tracking, Timeline, Milestone, Resource, Performance,* dan *Risk*, yang dikembangkan menggunakan *Google Looker Studio* dengan sumber data dari *Google Sheets*. Hasil pengujian melalui *Black Box Testing* menunjukkan seluruh fitur berfungsi sesuai spesifikasi, sementara *User Acceptance Test* (UAT) memperoleh skor 86% yang termasuk kategori sangat baik. Perbedaan utama dengan penelitian proyek tugas akhir ini terletak pada cakupan dan kompleksitas dashboard, di mana penelitian Azkia dkk. mencakup aspek yang lebih luas meliputi keuangan, sumber daya, dan manajemen risiko dengan metode EVM, sementara penelitian ini berfokus secara spesifik pada

Commented [u1]: Azkia, R., Yekti, Y. N. D., & Caesaron, D. (2024). Perancangan dashboard monitoring dan controlling kinerja proyek pada PT. XYZ menggunakan metode agile and lean development. *Action Research Literate*, *8*(9), 2660–2676.

pengembangan fitur dashboard berbasis data *daily report* dengan mekanisme otomasi kategorisasi status kesehatan proyek (*Project Health Status*) menggunakan perhitungan deviasi progres sederhana.

Penelitian yang dilakukan oleh Luthan dkk. (2023) dengan judul "*Reinventing Formulas for Construction Project Delay Index Due to Management and Production*" menyoroti permasalahan ketidakadilan dalam pembebanan sanksi keterlambatan proyek konstruksi, di mana selama ini pihak produksi (kontraktor) selalu menjadi satu-satunya pihak yang dikenai denda, sementara pihak manajemen (konsultan) tidak pernah dikenai sanksi meskipun turut berkontribusi terhadap keterlambatan. Penelitian ini bertujuan membangun formula yang akurat untuk menghitung *Management Delay Index* (MDI) dan *Production Delay Index* (PDI) yang diintegrasikan ke dalam dashboard *Ms. Project*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula yang diintegrasikan ke dashboard mampu menyajikan informasi yang lebih rinci dibandingkan perhitungan manual, meliputi nilai kontrak, progres aktual, progres rencana, deviasi progres, penyebab keterlambatan, serta indeks keterlambatan dari aspek manajemen dan produksi. Uji kelayakan menggunakan metode TELOS memperoleh skor rata-rata 8,26 dari skala 10 yang menunjukkan formula tersebut sangat layak dan akurat. Perbedaan utama dengan penelitian proyek tugas akhir ini terletak pada fokus dan kompleksitas formula, di mana penelitian Luthan dkk. mengembangkan formula indeks keterlambatan yang melibatkan variabel *free float*, *pending*, waktu mulai aktual, dan waktu selesai aktual untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan, sementara penelitian ini menggunakan perhitungan deviasi progres sederhana berupa selisih antara progres ideal dan progres realisasi dari data *daily report* untuk mengkategorikan status kesehatan proyek ke dalam indikator kode warna pada dashboard.

Penelitian yang dilakukan oleh Ernawan (2024) dengan judul "*Pemanfaatan Management Dashboard dalam Pengambilan Keputusan Strategis pada Perusahaan Bisnis Konstruksi (Studi Kasus PT. XYZ)*" menyoroti permasalahan kurang optimalnya

Commented [u2]: Luthan, P. L. A., Sitanggang, N., & Syafriandi, S. (2023). Reinventing formulas for construction project delay index due to management and production. *HighTech and Innovation Journal*, *4*(4), 768–778. https://doi.org/10.28991/HIJ-2023-04-04-06

Commented [u3]: Ernawan. (2024). Pemanfaatan management dashboard dalam pengambilan keputusan strategis pada perusahaan bisnis konstruksi (Studi kasus PT. XYZ). *Jurnal Mirai Management*, *9*(2), 124–139.

pengambilan keputusan strategis akibat keterbatasan akses data kinerja proyek yang akurat dan *real-time*. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dashboard manajemen sebagai sistem pendukung keputusan strategis dalam memantau indikator kinerja utama (KPI) perusahaan konstruksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dashboard manajemen mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat identifikasi masalah proyek, serta memperkuat koordinasi lintas divisi. Perbedaan utama dengan penelitian proyek tugas akhir ini adalah penelitian Ernawan berorientasi pada evaluasi dashboard sebagai alat pengambilan keputusan strategis tingkat perusahaan, sementara penelitian ini menekankan pengembangan fitur dashboard operasional berbasis *daily report* dalam sistem *project management*.

Penelitian yang dilakukan oleh Gledson dkk. (2024) dengan judul "Reporting on the Development of a Web-Based Prototype Dashboard for Construction Design Managers, Achieved through Design Science Research Methodology (DSRM)" menyoroti permasalahan inefisiensi dalam proses manajemen desain konstruksi, khususnya terkait koordinasi yang terfragmentasi, pemantauan kinerja desainer yang tidak memadai, serta pengelolaan arus informasi yang masih bersifat manual dan "analogue". Penelitian ini bertujuan mengembangkan purwarupa dashboard manajemen desain berbasis web untuk mendigitalisasi proses-proses tersebut dengan fokus pada pemantauan koordinasi desain, prioritas tugas, dan pelacakan kinerja desainer melalui analisis data Technical Queries (TQs) dan Requests for Information (RFIs). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dashboard yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan menyediakan visualisasi data real-time, seperti analisis RFI, pemantauan jadwal produksi desain (Information Release Schedule), serta tren kinerja desainer di tingkat proyek maupun portofolio. Umpan balik dari praktisi mengonfirmasi bahwa fitur-fitur tersebut memberikan manfaat signifikan dalam peran manajemen desain. Perbedaan utama dengan penelitian tugas akhir ini terletak pada fokus dan pengguna akhir dashboard. Penelitian Gledson dkk. berfokus pada dukungan keputusan untuk Manajer Desain dengan memanfaatkan data dari proses desain (seperti TQ dan RFI) untuk

Commented [u4]: Gledson, B., Rogage, K., Thompson, A., & Ponton, H. (2024). Reporting on the development of a web-based prototype dashboard for construction design managers, achieved through design science research methodology (DSRM). *Buildings, 14*(2), 335. https://doi.org/10.3390/buildings14020335

mengoptimalkan koordinasi dan alur kerja desain, sementara penelitian ini berfokus pada pemantauan kesehatan proyek secara umum dari sudut pandang kemajuan waktu dengan menggunakan data daily report dari teknisi lapangan. Perhitungan yang digunakan juga berbeda, di mana penelitian Gledson dkk. mengandalkan analisis tren dan beban kerja berdasarkan data kueri teknis, sedangkan penelitian ini menggunakan perhitungan deviasi progres sederhana berupa selisih antara progres ideal (berdasarkan durasi proyek) dan progres realisasi dari daily report untuk mengkategorikan status kesehatan proyek ke dalam indikator kode warna pada dashboard.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Pradibta (2025) dengan judul "Pengembangan Fitur Dashboard dan Report pada Aplikasi Project Management PT Intelix untuk Optimalisasi Pemantauan Proyek" membahas pengembangan fitur dashboard dan report pada aplikasi manajemen proyek di PT Intelix untuk mengatasi permasalahan pemantauan proyek yang tidak terintegrasi dan pembuatan laporan manual menggunakan Microsoft Excel. Menggunakan metode Agile Kanban, penelitian ini menambahkan tiga tabel proyek (High Priority Project, Milestone Project, dan Implementation Project) pada menu Dashboard serta beberapa sub-menu pada menu Report. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fungsi berjalan baik, mendapatkan respons "sangat sesuai" dari pengguna, dan sistem dinilai baik melalui evaluasi SUS. Penelitian Hakim & Pradiba mendukung penelitian ini karena sama-sama membuktikan bahwa pengembangan fitur dashboard mampu menyajikan informasi proyek secara lebih terperinci dan memudahkan pemantauan progres proyek secara real-time.

Commented [u5]: Hakim, A. L., & Pradibta, H. (2025). Pengembangan fitur dashboard dan report pada aplikasi Project Management PT Intelix untuk optimalisasi pemantauan proyek. *Jurnal Kendali Teknik dan Sains, 3*(4), 111–127. https://doi.org/10.59581/jkts-widyakarya.v3i3.5519

Penelitian yang dilakukan oleh Auliansyah dkk. (2023) dengan judul "*Rancang Bangun Sistem Monitoring Manajemen Proyek Konstruksi Menggunakan Kurva-S*" membahas pengembangan sistem *monitoring* berbasis website untuk proyek konstruksi di CV. Cahya Grafika menggunakan metode Kurva-S. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan keterbatasan sumber daya perusahaan dalam mengelola banyak proyek konstruksi secara simultan, serta kebutuhan untuk mengontrol kesesuaian antara rencana dan realisasi pekerjaan guna menghindari keterlambatan proyek. Tujuan

Commented [u6]: Auliansyah, C. R., Irawan, J. D., & Ariwibisono, F. X. (2022). Rancang bangun sistem monitoring manajemen proyek konstruksi menggunakan kurva-S. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 6*(2), 1106–1114. https://doi.org/10.36040/jati.v6i2.5324

penelitian ini adalah membangun sistem yang dapat membuat rencana anggaran biaya (RAB), *schedule* rencana, laporan mingguan proyek, dan rekapitulasi laporan proyek dengan *output* berupa Gantt Chart dan Kurva-S yang menampilkan perbandingan antara kurva rencana dan kurva realisasi. Sistem yang dikembangkan memiliki fitur *multi-user* dengan empat hak akses berbeda (admin, manager proyek, manager lapangan, dan direktur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berhasil menghitung nilai deviasi keterlambatan proyek, dengan studi kasus pada proyek peningkatan jalan Wadungasri-Tambaksumur menunjukkan nilai deviasi -0,17% pada minggu ke-1 dan -1,19% pada minggu ke-2 yang mengindikasikan keterlambatan. Pengujian *black-box* pada seluruh hak akses menunjukkan sistem berfungsi sesuai harapan. Penelitian Auliansyah dkk. mendukung penelitian ini karena sama-sama mengembangkan sistem *monitoring* proyek dengan membandingkan progres rencana dan progres aktual, serta menggunakan perhitungan deviasi untuk mendeteksi keterlambatan proyek. Namun demikian, penelitian ini juga menjadi pembanding karena terdapat perbedaan pada metode dan fokus pengembangan. Penelitian Auliansyah dkk. (2023) menggunakan metode Kurva-S yang memerlukan perhitungan bobot kontrak dan bobot rencana komulatif yang kompleks, serta mencakup fitur RAB, Gantt Chart, dan *multi-user* dengan empat level akses. Sementara itu, penelitian ini lebih sederhana dengan fokus pada pengembangan *smart system* berupa kategorisasi otomatis status kesehatan proyek menggunakan perhitungan deviasi sederhana antara progres ideal (berdasarkan durasi proyek) dan progres aktual dari data *daily report* yang diinputkan langsung oleh teknisi lapangan, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk indikator kode warna untuk memudahkan deteksi dini proyek bermasalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dkk. (2024) dengan judul "*Sistem Manajemen Proyek pada Startup Jasa Pembuatan Aplikasi*" membahas perancangan dan pengembangan sistem manajemen proyek berbasis web untuk penyedia layanan pengembangan aplikasi di lingkungan *startup* teknologi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan umum yang sering muncul dalam manajemen proyek di *startup*,

Commented [u7]: Iqbal, M., Emilia, E., Ramadhani, Z., Ariska, D., Rahayu, S., & Oktarina, S. (2024). Sistem manajemen proyek pada startup jasa pembuatan aplikasi. *Klik: Jurnal Ilmu Komputer, 5*(2), 44–52. https://doi.org/10.56869/klik.v5i2.592

seperti keterlambatan, pembengkakan biaya, dan kualitas produk di bawah standar akibat ketidakmampuan dalam mengatur proyek secara efisien. Tujuan penelitian ini adalah merancang sistem yang dapat memfasilitasi kerja tim, manajemen tugas, pelaporan waktu nyata (*real-time*), dan pelacakan kemajuan proyek. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall dengan tahapan *communication*, *planning*, *modelling*, *construction*, dan *deployment*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mengelola berbagai aspek proyek meliputi manajemen tugas, kolaborasi tim, pelacakan anggaran, serta menampilkan *dashboard* ringkasan proyek, *Gantt chart*, dan log aktivitas. Pengujian menggunakan metode *Black Box* pada seluruh fitur menunjukkan sistem beroperasi dengan stabilitas baik dan sesuai harapan pengguna. Penelitian ini mendukung penelitian tugas akhir karena sama-sama mengembangkan sistem manajemen proyek berbasis web yang memudahkan pemantauan proyek melalui *dashboard* dengan ringkasan informasi proyek, progres tugas, dan kolaborasi tim. Namun demikian, penelitian ini juga menjadi pembanding karena terdapat perbedaan pada fokus dan mekanisme pemantauan. Penelitian Iqbal dkk. (2024) berfokus pada pengembangan sistem manajemen proyek komprehensif untuk *startup* jasa pembuatan aplikasi dengan cakupan fitur yang luas meliputi manajemen tugas, tim, anggaran, serta *Gantt chart*, dan menggunakan metode Waterfall dalam pengembangannya. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik pada pengembangan fitur *dashboard* dengan kemampuan *smart system* berupa kategorisasi otomatis status kesehatan proyek menggunakan perhitungan deviasi sederhana antara progres ideal (berdasarkan durasi proyek) dan progres aktual dari data *daily report* yang diinputkan langsung oleh teknisi lapangan, yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk indikator kode warna untuk memudahkan deteksi dini proyek bermasalah tanpa mencakup fitur manajemen anggaran dan *Gantt chart* secara mendalam.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
1	Perancangan Dashboard Monitoring dan Controlling Kinerja Proyek pada PT. XYZ Menggunakan Metode Agile and Lean Development	Rifan Azkia, Yusuf Nugroho Doyo Yekti, Dino Caesaron	2024	Menghasilkan dashboard dengan fitur *Project Overview*, *Financial Tracking*, *Timeline*, *Milestone*, *Logistic*, *Performance*, dan *Risk*. Hasil validasi menunjukkan dashboard relevan dengan tingkat kepuasan pengguna 86%.
2	Pemanfaatan Management Dashboard dalam Pengambilan Keputusan Strategis pada Perusahaan Bisnis Konstruksi (Studi Kasus PT. XYZ)	Ernawan	2024	Dashboard manajemen membantu eksekutif memantau KPI secara *real-time*, meningkatkan akurasi data, memfasilitasi komunikasi antar departemen, serta memberikan dampak positif pada biaya, mutu, dan waktu.
3	Reporting on the Development of a Web-Based Prototype Dashboard for Construction Design Managers	Barry Gledson, Kay Rogage, Anna Thompson, Hazel Ponton	2024	Mengembangkan purwarupa *dashboard* berbasis web untuk manajer desain konstruksi dengan fokus pada pemantauan koordinasi desain, prioritas tugas, dan pelacakan kinerja desainer melalui analisis data TQ dan RFI.
4	Pengembangan Fitur Dashboard dan Report pada Aplikasi Project Management PT Intelix untuk Optimalisasi Pemantauan Proyek	Afif Lukmanul Hakim, Hendra Pradibta	2025	Menambahkan fitur *High Priority Project*, *Milestone Project*, dan *Implementation Project* pada menu *Dashboard* serta sub-menu pada menu *Report*. Pengujian Black Box dan UAT menunjukkan seluruh fungsi berjalan baik dengan respons "sangat sesuai".
5	Rancang Bangun Sistem Monitoring Manajemen Proyek Konstruksi Menggunakan Kurva-S	Cindia Rama Auliansyah, Joseph Dedy Irawan, Fransiscus Xaverius Ariwibisono	2023	Membangun sistem monitoring berbasis *website* dengan metode Kurva-S yang dapat membuat RAB, *schedule* rencana, laporan mingguan, dan rekapitulasi laporan dengan output *Gantt Chart* dan Kurva-S. Sistem berhasil menghitung deviasi keterlambatan proyek.

No	Judul	Penulis	Tahun	Hasil
6	Sistem Manajemen Proyek pada Startup Jasa Pembuatan Aplikasi	Muhammad Iqbal, Emilia Emilia, Zahra Ramadhani, Dempi Ariska, Sri Rahayu, Serly Oktarina	2024	Mengembangkan sistem manajemen proyek berbasis web dengan metode Waterfall yang memfasilitasi kerja tim, manajemen tugas, pelaporan *real-time*, dan pelacakan kemajuan proyek. Pengujian Black Box menunjukkan sistem beroperasi dengan stabilitas baik.
7	Reinventing Formulas for Construction Project Delay Index Due to Management and Production	Putri Lynna A. Luthan, Nathanael Sitanggang, Syafriandi Syafriandi	2023	Membangun formula indeks keterlambatan proyek konstruksi dari aspek manajemen dan produksi yang diintegrasikan ke dalam *dashboard* Ms. Project. Formula mampu menyajikan informasi nilai kontrak, progres aktual, progres rencana, deviasi progres, penyebab keterlambatan, serta indeks keterlambatan manajemen dan produksi.

2.2 Landasan Teori

Dalam pengerjaan penelitian Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa landasan teori yang menjadi acuan diantaranya sebagai berikut:

2.2.1 Manajemen Proyek dan Sistem *Monitoring*

Manajemen proyek merupakan disiplin ilmu yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian untuk memastikan tujuan proyek tercapai sesuai batasan waktu, biaya, dan ruang lingkup. Dalam proses pengendalian, manajer memerlukan informasi akurat sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Sistem monitoring berperan sebagai salah satu instrumen yang menyediakan informasi tersebut melalui pelacakan data aktivitas lapangan (Chaerul dkk., 2021). Praktik konvensional yang menggunakan alat tidak terintegrasi seperti spreadsheet terpisah sering menghambat aliran informasi dan mempersulit proses pengendalian. Oleh karena itu, penerapan project management system terpadu menjadi solusi untuk mengintegrasikan seluruh proses manajemen proyek, mulai dari pencatatan data harian hingga penyajian informasi bagi manajemen. Pengembangan fitur seperti dashboard

Commented [u8]: Chaerul, R., Putra, W., & Hanggara, B. (2021). Utilizing of the Trello API within the development of a monitoring information system recording of project activities using a website-based kanban system (Case study: Electrical project of PT. XYZ). *Journal of Information Technology and Computer Science, 6*(2), 146–157. https://doi.org/10.25126/jitecs.202162289

berbasis data daily report bertujuan untuk mendukung efektivitas pengelolaan proyek secara menyeluruh, termasuk koordinasi tim, evaluasi kemajuan, dan pengambilan keputusan strategis.

2.2.2 *Dashboard* Manajemen Proyek

Dalam *project management system*, *dashboard* berfungsi sebagai antarmuka pengguna grafis yang memvisualisasikan data operasional secara terpusat. Berbeda dengan sistem analitik prediktif, *dashboard* memfasilitasi transparansi informasi dengan mengubah rekapitulasi data *daily report* tekstual yang diinput oleh teknisi lapangan menjadi representasi visual terstruktur, seperti grafik kemajuan fisik dan indikator ketepatan waktu terhadap rencana awal atau *baseline* (Silmina & Azmi, 2025). Melalui transformasi visual ini, manajer proyek dapat memahami kondisi portofolio proyek secara komprehensif, mengevaluasi kinerja operasional berdasarkan fakta aktual, serta merumuskan keputusan tindak lanjut dengan jauh lebih efisien tanpa harus membaca laporan secara manual (Reddy, 2025).

Commented [u9]: Silmina, E. P., & Azmi, A. F. (2025). Perancangan dashboard operations berbasis web di PT XYZ Indonesia menggunakan metode prototyping. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *9*(2).

Commented [u10]: Reddy, A. (2025). Dashboard Real-Time Monitoring of Construction Projects. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT*. https://doi.org/10.55041/ijsrem47451.

2.2.3 Sistem Informasi *Daily Report* Proyek

Sistem Informasi *Daily Report* Proyek merupakan sebuah modul esensial di dalam ekosistem Sistem Manajemen Proyek (*Project Management System*) yang berfungsi untuk merekam aktivitas operasional harian secara terstruktur. Dalam siklus pelaksanaan proyek, pelaporan harian bertindak sebagai sumber data utama yang mendokumentasikan rincian progres pekerjaan, alokasi waktu, status penyelesaian tugas, serta kendala teknis di lapangan. Integrasi pelaporan harian ke dalam sistem manajemen proyek bertujuan untuk melakukan sentralisasi data historis, memastikan bahwa seluruh rekam jejak operasional dapat dilacak (*traceable*) secara aktual dan terhindar dari risiko kehilangan atau ketidakkonsistenan data akibat pencatatan manual (Alawiyah dkk. 2022).

Commented [u11]: Alawiyah, T., Mulyani, Y. S., Gunawan, M. A., Setiaji, R., & Nurdin, H. (2022). Sistem informasi manajemen proyek (SIMAPRO) berbasis web (Studi kasus: PT. Arya Bakti Saluyu). *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, *10*(2), 129–135.

Untuk memaksimalkan nilai dari himpunan data laporan harian tersebut, diperlukan pengembangan fitur antarmuka visual berupa *dashboard* pemantauan (*monitoring*). Fitur *dashboard* ini secara teknis akan mengekstrak, mengolah, dan menerjemahkan data *daily report* yang mentah menjadi informasi visual yang

komprehensif, seperti grafik progres, metrik capaian, maupun rekapitulasi status proyek. Dengan terintegrasinya data *daily report* ke dalam fitur *dashboard* berbasis web, proses pengawasan administrasi dan evaluasi proyek oleh pihak manajemen menjadi jauh lebih efisien, terpusat, dan dapat dipantau secara langsung (*real-time*) berdasarkan data faktual dari lapangan.

2.2.4 *Project Health Status*

Status kesehatan proyek (*Project Health Status*) merupakan indikator evaluatif faktual yang membandingkan progres aktual di lapangan dengan rencana awal (*baseline*). Alih-alih menggunakan analitik prediktif yang kompleks, indikator ini berfungsi sebagai instrumen audit visual untuk mendeteksi penyimpangan jadwal sedini mungkin. Pada implementasi *dashboard*, status kesehatan direpresentasikan melalui metode *Red-Amber-Green* (RAG) yang secara otomatis mengagregasi data mentah dari *daily report*. Melalui visualisasi warna yang intuitif ini—seperti indikator "Hijau" untuk operasional yang linear dengan jadwal dan "Merah" untuk kondisi kritis—pihak manajemen memperoleh transparansi informasi tingkat tinggi guna memantau kelancaran proyek secara *real-time* tanpa harus menelusuri tumpukan laporan manual (Fonseca dkk., 2025).

Commented [u12]: Fonseca, S., Benito, A., & Ramírez, C. (2025). Development and Application of an Innovative Planning and Monitoring Tool to Optimize Construction Projects. *Buildings*. https://doi.org/10.3390/buildings15020160.

2.2.5 *Early Warning System* (EWS) Berbasis *Schedule Performance Index*

Dalam manajemen proyek operasional yang dinamis, *Early Warning System* (EWS) atau Sistem Peringatan Dini merupakan mekanisme proaktif yang diintegrasikan ke dalam perangkat lunak pemantauan untuk mendeteksi potensi penyimpangan jadwal secara otomatis. Dalam ranah sistem informasi operasional, EWS tidak dirancang menggunakan algoritma analitik prediktif yang kompleks, melainkan mengandalkan kemampuan sistem dalam mengotomatisasi pemrosesan data faktual secara *real-time*. Tujuan utama implementasi EWS adalah memangkas jeda waktu (*information lag*) antara terjadinya kendala progres di lapangan dengan sampainya peringatan tersebut kepada manajer proyek, sehingga mitigasi keterlambatan dapat dilakukan sedini mungkin berdasarkan data yang valid.

Sebagai parameter pemicu (*trigger*), EWS pada sistem ini mengadopsi metrik *Schedule Performance Index* (SPI). SPI bertindak sebagai indikator matematis pasti yang membandingkan persentase pekerjaan aktual yang telah dilaporkan selesai (*Earned Value*) dengan persentase target rencana awal proyek (*Planned Value*). Di dalam arsitektur sistem ini, sumber data aktual diekstraksi secara berkelanjutan dari input *daily report* para pelaksana lapangan. Kecerdasan sistem (*smart system capability*) bekerja di latar belakang dengan mengakumulasi data mentah dari laporan harian tersebut dan secara otomatis mengkalkulasi rasio SPI tanpa memerlukan intervensi manual dari pihak administrator.

Otomatisasi ini kemudian terintegrasi langsung dengan antarmuka *dashboard monitoring*. Apabila hasil kalkulasi sistem menunjukkan nilai $SPI < 1$ (yang berarti progres aktual tertinggal dari target rencana), EWS akan seketika memicu indikator peringatan visual—seperti perubahan warna status menjadi merah atau *flagging* kondisi "Kritis"—pada layar *dashboard*. Melalui pendekatan pengawasan proaktif ini, sistem mentransformasikan tumpukan data rekapitulasi *daily report* menjadi wawasan visual yang instan, membebaskan manajer proyek dari beban perhitungan manual, serta memastikan bahwa evaluasi kinerja operasional dapat berjalan secara presisi, terpusat, dan sangat responsif (Umana dkk., 2022).

Commented [u13]: Umana, A., Afrihyia, E., Appoh, M., Frempong, D., Akinboboye, O., Okoli, I., Umar, M., & Omolayo, O. (2022). Data-Driven Project Monitoring: Leveraging Dashboards and KPIs to Track Performance in Technology Implementation Projects. *Journal of Frontiers in Multidisciplinary Research*. https://doi.org/10.54660/.ijfmr.2022.3.2.35-48.

Secara matematis, perhitungan metrik indikator kinerja jadwal dalam sistem ini merujuk pada standar *Earned Value Management* (EVM). Rumus dasar komparasi yang diotomatisasi oleh sistem adalah sebagai berikut:

$$\underset{\text{Schedule Performance Index}}{SPI} = \frac{\underset{\text{Earned Value}}{EV}}{\underset{\text{Planned Value}}{PV}}$$

Gambar 2.1 Schedule Performance Index (SPI)

Keterangan Variabel:

a. SPI (*Schedule Performance Index*) : Nilai indeks efisiensi waktu pelaksanaan proyek.
b. EV (*Earned Value* / Nilai Hasil) : Persentase bobot pekerjaan aktual yang secara faktual telah diselesaikan di lapangan. Dalam sistem ini, nilai EV diakumulasikan secara otomatis dari progres tugas yang diinputkan oleh pekerja melalui formulir *daily report*.
c. PV (*Planned Value* / Nilai Rencana) : Persentase bobot target pekerjaan yang seharusnya telah diselesaikan pada titik waktu pemantauan tertentu berdasarkan jadwal rencana awal (*baseline*).

Melalui hasil komparasi matematis tersebut, sistem *dashboard* dirancang untuk menerjemahkan nilai numerik SPI menjadi status visibilitas proyek dengan parameter sebagai berikut:

a. **SPI = 1 :** Proyek berjalan tepat waktu sesuai dengan target jadwal (*On Schedule*). Indikator visual umumnya menampilkan status normal atau warna hijau.
b. **SPI > 1 :** Proyek berjalan lebih cepat dari target jadwal yang direncanakan (*Ahead of Schedule*).
c. **SPI < 1 :** Proyek mengalami keterlambatan operasional (*Behind Schedule*). Kondisi matematis inilah yang bertindak sebagai pemicu utama (*trigger*) bagi *Early Warning System* untuk secara otomatis menampilkan notifikasi kritis atau merubah indikator visual *dashboard* menjadi peringatan warna merah.

2.2.6 *Framework* Next.js

Next.js merupakan kerangka kerja (*framework*) front-end berbasis React yang dirancang untuk membangun antarmuka web berskala *enterprise* dengan performa tinggi. Keunggulan utamanya terletak pada dukungan *Server-Side Rendering* (SSR) dan arsitektur berbasis komponen (*component-based*), yang sangat ideal untuk memvisualisasikan elemen *dashboard* secara modular, seperti grafik progres kerja dan

indikator warna *Red-Amber-Green* (RAG). Dalam implementasi *Early Warning System* (EWS) pada manajemen proyek, Next.js berperan krusial melalui mekanisme penarikan data asinkron. *Framework* ini mampu mengonsumsi akumulasi data *daily report* dan hasil kalkulasi *Schedule Performance Index* (SPI) dari *backend* secara *real-time*. Ketika terdeteksi perubahan status proyek menjadi kritis (misalnya SPI < 1), antarmuka *dashboard* dapat merefleksikan peringatan visual tersebut secara instan tanpa perlu memuat ulang (*refresh*) keseluruhan halaman, sehingga manajer proyek dapat memperoleh informasi operasional yang faktual secara cepat dan interaktif (Genne, 2025).

Commented [u14]: Genne, S. (2025). Optimizing Enterprise Web Performance Through Server-Side Rendering: A Next.Js Framework Implementation. *European Modern Studies Journal*. https://doi.org/10.59573/emsj.9(3).2025.21.

2.2.7 *Unified Modeling Language*

UML (*Unified Modeling Language*) adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak yang berorientasi objek. UML sangat berguna dalam menggambarkan kebutuhan pengguna dan alur sistem melalui berbagai diagram dan tabel data. UML menggunakan konsep desain berorientasi objek dan tidak bergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Ini memungkinkan pemodelan sistem yang kompleks dan besar dengan cara yang terstruktur (Maggi dkk., 2020). UML mencakup berbagai jenis diagram yang dibagi menjadi diagram struktural dan diagram perilaku. Diagram kelas adalah salah satu yang paling umum digunakan untuk memodelkan tampilan desain statis dari system (Al-Fedaghi, 2021). Terdapat beberapa jenis diagram pada uml diantaranya yaitu, *Use Case Diagram*, *Sequence Diagram*, *Class Diagram*, dan *Activity Diagram*.

Commented [u15]: Maggi, P., Booch, G., Jacobson, I., & Rumbaugh, J. (2020). Unified modeling language: Definitions. Dalam *Encyclopedia of Information Science and Technology*. CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781420036336.ch3

Commented [u16]: Al-Fedaghi, S. (2021). Classes in object-oriented modeling (UML): Further understanding and abstraction. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 21*(5), 21–32. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.5.21

1) *Use Case Diagram*

Use case adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. *Use case* bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara *user* sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. *Use case* merupakan konstruksi untuk mendeskripsikan bagaimana sistem akan terlihat di mata user. Sedangkan *use case diagram* memfasilitasi komunikasi diantara analis dan pengguna serta antara analis dan klien (Ahmad, 2022).

Commented [u17]: Ahmad, N. K. (2022). *Analisa & perancangan sistem informasi berorientasi objek*. Widina Media Utama.

Tabel 2.2 Simbol Use Case Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Aktor	Mewakili peran orang atau pengguna, sistem yang lain dan alat ketika berkomunikasi dengan *use case*
	Use case	Abstraksi dan interaksi sistem dan aktor
	Association	Abstraksi dari penghubung antara aktor dan *use case*
	Generalisasi	Menunjukan spealisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan *use case*
<<include>>	*Include*	Menunjukan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsional dari *use case* lain
<<extend>>	*Extend*	Menunjukan bahwa suatu *use case* merupakan tambahan fungsionalitas dari *use case* lainnya jika suatu kondisi terpenuhi

Sumber: (Suriya & Nivetha, 2023)

Commented [u18]: Suriya, D., & S., N. (2023). Design of UML Diagrams for WEBMED - Healthcare Service System Services. *EAI Endorsed Trans. e Learn.*, 8, e5. https://doi.org/10.4108/eetel.v8i1.3015.

2) *Sequence Diagram*

Sequence diagram menunjukkan bagaimana sekelompok objek dapat berkolaborasi dalam beberapa behavior atau kebiasaan. *Sequence diagram* menggambarkan perilaku pada sebuah skenario. Kegunaan dari *sequence diagram*

adalah menunjukkan serangkaian proses yang dikirim antara objek yang berinteraksi dengan objek, sesuatu terjadi pada titik tertentu pada saat eksekusi sistem.

Tabel 2.3 Simbol Sequence Diagram

Simbol	**Nama**	**Keterangan**
	Aktor	Menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem.
	*Entity Class*	Menggambarkan hubungan yang akan dilakukan.
	*Boundary Class*	Menggambarkan sebuah gambaran dari *form*
	Control Class	Mengambarkan penghubung antara *boundary* dengan tabel
	*A focus of control & A life line*	Mengambarkan tempat mulai dan berakhirnya *message*
	A message	Menggambarkan pengiriman pesan

Sumber: (Suriya & Nivetha, 2023)

Commented [u19]: Suriya, D., & S., N. (2023). Design of UML Diagrams for WEBMED - Healthcare Service System Services. *EAI Endorsed Trans. e Learn.*, 8, e5. https://doi.org/10.4108/eetel.v8i1.3015.

3) *Class Diagram*

Class adalah dekripsi kelompok obyek-obyek dengan properti, perilaku (operasi) dan relasi yang sama. Sehingga dengan adanya *class diagram* dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut tercermin dari *class-class* yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa *class diagram*. *Class diagram* sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem.

Tabel 2.4 Simbol Class Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Generalization	Hubungan dimana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk
	Nary Association	Upaya untuk menghidari asosiasi dengan lebih dari 2 objek
	Class	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama
	Collaboration	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor
	Realization	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek
	Dependency	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang

Simbol	Nama	Keterangan
		bergantung padanya elemen yang tidak mandiri
———————	*Association*	Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya

Sumber: (Suriya & Nivetha, 2023)

Commented [u20]: Suriya, D., & S., N. (2023). Design of UML Diagrams for WEBMED - Healthcare Service System Services. *EAI Endorsed Trans. e Learn.*, 8, e5. https://doi.org/10.4108/eetel.v8i1.3015.

4) *Activity Diagram*

Activity diagram merupakan gambaran dari rangkaian aliran dari aktivitas. Tujuan dari *activity diagram* adalah mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat digunakan aktivitas lain.

Tabel 2.5 Simbol Activity Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Start point	Diletakkan pada pojok kiri atas penanda awal aktivitas
	End point	Akhir aktivitas
	*Activities*	Menggambar kan suatu proses atau kegiatan bisnis

Simbol	Nama	Keterangan
	*Fork*/percabangan	Digunakan untuk menunjukan kegiatan yang dilakukan secara pararel atau untuk mengabungkan dua kegiatan yang pararel menjadi satu
	*Join*/penggabungan	Digunakan untuk menunjukan adanya dekomposisi

Sumber: (Khomokhoana dkk., 2025)

2.2.8 *Entity Relationship Diagram*

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan alat pemodelan konseptual tahap awal untuk merepresentasikan entitas, atribut, dan hubungan dalam basis data secara grafis. ERD bermanfaat untuk memvisualisasikan struktur data sebelum tahap implementasi teknis dilakukan (Pulungan dkk., 2023), meminimalisir berbagai kesalahan desain, serta menjadi alat komunikasi visual yang efektif antara pengembang dan pemangku kepentingan. Secara struktural, komponen utama ERD terdiri dari entitas (objek data unik), atribut yang mendeskripsikan properti entitas beserta kunci primernya ('Afiifah dkk., 2022), dan hubungan yang menggambarkan interaksi antar entitas dalam sistem.

Tabel 2.6 Entity Relationship Diagram

No.	Simbol	Keterangan

Commented [u21]: Khomokhoana, P., Fouché, R., & Nkalai, T. (2025). Semiotic analysis of UML class diagrams in pedagogy: a case of first-year BCIS students. *Discover Education*, 4. https://doi.org/10.1007/s44217-025-00817-8.

Commented [u22]: ((Pulungan dkk., 2023), S., Febrianti, R., Lestari, T., Gurning, N., & Fitriana, N. (2023). Analisis teknik entity-relationship diagram dalam perancangan database. Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB), 1(2). https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.533

Commented [u23]: 'Afiifah, K., Azzahra, Z., & Anggoro, A. (2022). Analisis teknik entity-relationship diagram dalam perancangan database: Sebuah literature review. *INTECH*. https://doi.org/10.54895/intech.v3i1.1261

1.		**Entitas**, yaitu representasi objek data diskrit yang memiliki identitas unik di dalam sistem.
2.		**Relasi**, yaitu keterkaitan hubungan yang mengikat antar-entitas dalam basis data. Relasi ini dapat diklasifikasikan ke dalam pemetaan one-to-one (satu ke satu), one-to-many (satu ke banyak), atau many-to-many (banyak ke banyak).
3.		**Atribut**, yaitu properti atau karakteristik spesifik yang menjabarkan informasi mendetail dari sebuah entitas maupun relasi.
4.		**Garis**, merupakan penghubung visual yang merangkai entitas dengan atributnya, serta menyambungkan himpunan entitas dengan relasinya.
5.		**Input/output**, yaitu indikator visual yang merepresentasikan alur keluar-masuknya data, parameter operasional, maupun informasi di dalam sistem.

Sumber: (Pulungan dkk., 2023)

Commented [u24]: Pulungan, S., Febrianti, R., Lestari, T., Gurning, N., & Fitriana, N. (2023). Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram Dalam Perancangan Database. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*. https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.533.

2.2.9 Basis Data

Data base atau basis data merupakan kumpulan data yang memiliki format dan struktur-struktur tertentu sehingga memungkinkan sistem berbasis komputer dapat melakukan penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data secara cepat. Dalam basis data juga terdapat sebuah sistem basis data, terdiri dari data secara logis saling terkait dan biasanya disimpan dalam sebuah repositori data. Karena pada sistem basis data penyimpanan data bersifat satu tempat, maka memungkinkan dalam saat bersamaan beberapa pengguna mengakses dan memperbarui basis data tersebut. Tempat untuk mengakses dan mengolah basis data ini dikenal sebagai DBMS (*Basis*

data Management System). Sebuah sistem basis data sendiri terdiri dari 5 komponen yaitu: perangkat keras, perangkat lunak, data, prosedur, dan manusia (Hadiprakoso, 2021).

Commented [u25]: Hadiprakoso, R. (2021). *Sistem basis data*. RBH.

1) Perangkat Keras

   DBMS membutuhkan *hardware* (perangkat keras) untuk dapat diinstal. Perangkat keras dapat berupa sebuah komputer pribadi sampai jaringan komputer tergantung pada kebutuhan organisasi dan DBMS yang digunakan. Beberapa DBMS hanya berjalan pada perangkat keras atau sistem operasi tertentu, sementara yang lain dapat dijalankan pada berbagai macam perangkat keras dan sistem operasi. Lebih lanjut lagi perangkat keras di sini dapat mengacu pada semua perangkat fisik sistem, termasuk komputer.

2) Perangkat Lunak

   Dalam DBMS terdapat 3 jenis perangkat lunak yaitu sistem operasi, DBMS, dan program aplikasi lainnya. Sistem operasi mengelola semua komponen perangkat keras dan memungkinkan semua perangkat lunak lain untuk diinstal dan berjalan di komputer, contoh perangkat lunak sistem operasi termasuk Microsoft, Linux, dan Mac OS. Selanjutnya DBMS sebagai pengelola basis data seperti, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL. Program aplikasi lainnya digunakan untuk mengakses data yang terdapat didalam basis data untuk menghasilkan laporan dan informasi lainnya.

3) Data

   Komponen yang paling penting dari sistem basis data dari sudut pandang pengguna adalah data. Data di sini meliputi pengumpulan fakta yang tersimpan dalam basis data. Karena data adalah bahan baku dari mana informasi yang dihasilkan, menentukan data yang masuk ke dalam basis data dan bagaimana mengatur data menjadi informasi yang berharga merupakan bagian penting dari sebuah sistem basis data.

4) Prosedur

   Prosedur merupakan sebuah aturan yang mengatur desain dan penggunaan sistem basis data.

5) Manusia

   Komponen ini mencakup semua pengguna dari sistem basis data. Berdasarkan fungsi pekerjaan utama masing-masing terdapat empat jenis pengguna yang dapat diidentifikasi dalam sistem basis data yakni: administrator basis data, perancang basis data, analis sistem, *programmer*, dan pengguna akhir.

2.2.10 *Structure Query Language*

Structured Query Language (SQL) merupakan bahasa pemrograman standar yang dirancang secara spesifik untuk mengelola, memanipulasi, dan mengekstraksi informasi dari Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS). Secara fungsional, SQL memfasilitasi interaksi tingkat tinggi antara aplikasi perangkat lunak dan repositori data melalui eksekusi kueri (*query*) terstruktur. Instruksi dalam SQL umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, di antaranya *Data Definition Language* (DDL) untuk merancang skema atau struktur tabel, serta *Data Manipulation Language* (DML) seperti perintah `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, dan `DELETE` yang bertugas memproses data operasional. Keunggulan utama SQL terletak pada kemampuannya mengeksekusi fungsi agregasi komputasional, memfilter informasi spesifik, serta mengonsolidasikan entitas dari berbagai tabel yang saling berelasi melalui operasi *JOIN*, sehingga memungkinkan pengambilan maupun pengolahan data berskala besar secara cepat, akurat, dan terpusat di tingkat *database* (Khan dkk., 2023).

Commented [u26]: Khan, W., Kumar, T., Cheng, Z., Raj, K., Roy, A., & Luo, B. (2023). SQL and NoSQL Database Software Architecture Performance Analysis and Assessments - A Systematic Literature Review. *Big Data Cogn. Comput.*, 7, 97. https://doi.org/10.3390/bdcc7020097.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan *prototyping* yang merupakan salah satu pendekatan dalam *System Development Life Cycle* (SDLC). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengembangkan fitur dashboard pada project management system yang sudah berjalan di PT Smart Home Inovasi Yogyakarta, di mana diperlukan pemahaman kebutuhan pengguna secara mendalam serta umpan balik berulang untuk menyempurnakan antarmuka dan fungsionalitas dashboard berbasis data *daily report*. Pendekatan *prototyping* memungkinkan pengembang untuk membuat model awal sistem (*prototype*) yang kemudian dievaluasi langsung oleh pengguna—dalam hal ini Manajer Proyek dan Teknisi Lapangan—sehingga perbaikan dapat dilakukan secara bertahap hingga diperoleh fitur dashboard yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan manajemen proyek.

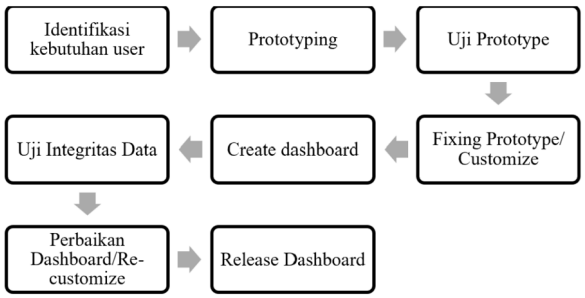

Gambar 3.1 Metode Penelitian

Adapun tahapan dalam metode *prototyping* meliputi:

1. **Identifikasi Kebutuhan *User*:** Menganalisis kebutuhan manajer dan admin PT SHI untuk mengubah tumpukan *daily report* yang berupa teks menjadi informasi visual, seperti status kesehatan proyek dan target vs aktual.
2. ***Prototyping*:** Membuat rancangan desain awal (*mockup*) antarmuka *dashboard*, termasuk tata letak grafik, *progress bar*, dan indikator warna *Red-Amber-Green* (RAG).
3. **Uji *Prototype*:** Mempresentasikan desain awal tersebut kepada pengguna (manajer PT SHI) untuk dinilai apakah tampilannya sudah intuitif dan mempermudah pemantauan.
4. ***Fixing Prototype / Customize*:** Merevisi dan menyesuaikan desain *dashboard* (tata letak, jenis grafik, warna) berdasarkan masukan dari manajer pada tahap pengujian awal.
5. ***Create Dashboard*:** Membangun antarmuka *dashboard* secara nyata menggunakan *framework* Next.js. Pada tahap ini, komponen visual dikembangkan dan logika otomatisasi perhitungan (SPI) ditanamkan agar sistem dapat merender ekstraksi data *daily report* secara cepat dan asinkronus.
6. **Uji Integritas Data:** Menguji sistem menggunakan data laporan harian asli milik PT SHI untuk memastikan perhitungan agregasi kemajuan proyek dan perubahan warna peringatan dini (EWS) berjalan akurat.
7. **Perbaikan *Dashboard / Re-customize*:** Memperbaiki *bug* pada baris kode jika masih terdapat kesalahan dalam kalkulasi agregasi data atau tampilan visual saat pengujian.
8. ***Release Dashboard*:** Meluncurkan fitur *dashboard* pemantauan yang sudah stabil ke dalam aplikasi manajemen proyek PT SHI agar siap digunakan secara operasional.

3.2 Obyek Penelitian

3.2.1 Gambaran Umum

PT Smart Home Inovasi Yogyakarta (SHI) merupakan sebuah perusahaan teknologi yang berlokasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perusahaan ini mengkhususkan diri pada pengembangan dan implementasi solusi *Smart Home* serta *Internet of Things* (IoT). Mengusung visi sebagai penyedia solusi hunian cerdas terdepan, PT SHI menghadirkan berbagai inovasi otomasi perangkat—mulai dari sistem keamanan, pengaturan suhu, hingga efisiensi energi—guna menciptakan ekosistem hunian yang aman, nyaman, dan hemat energi bagi kliennya.



Gambar 3.2 Gambaran Umum

3.2.2 Proses Bisnis dan Aktor yang Terlibat

Dalam sistem manajemen proyek yang diusulkan pada penelitian ini, terdapat desentralisasi wewenang pelaporan untuk memangkas birokrasi administratif. Adapun aktor utama yang terlibat dan hak aksesnya dalam proses bisnis pencatatan *daily report* adalah sebagai berikut:

1. Teknisi Lapangan: Aktor yang bertugas sebagai pelaksana operasional di lokasi klien (misalnya melakukan instalasi IoT). Dalam sistem ini, teknisi diberikan hak akses untuk menginputkan data *daily report* (berupa persentase progres pekerjaan

harian) secara langsung ke dalam sistem, tanpa harus melaporkannya terlebih dahulu secara manual atau tekstual melalui perantara.

2. Manajer Proyek: Aktor pada tingkat manajerial yang bertanggung jawab mengawasi seluruh portofolio proyek. Manajer bertindak sebagai pengguna utama antarmuka *dashboard*. Aktor ini tidak lagi bertugas menginput data laporan dari teknisi, melainkan fokus pada mengevaluasi *Project Health Status*, memantau grafik kemajuan proyek, dan merespons peringatan dini (*Early Warning System*) yang dihasilkan oleh sistem.

Alur Proses Bisnis Pemantauan Proyek (Setelah Pengembangan):

Proses bisnis pemantauan proyek melalui *dashboard* ini dirancang untuk bekerja secara otomatis dan *real-time* dengan tahapan operasional sebagai berikut:

1. Pencatatan Progres Aktual: Setelah menyelesaikan pekerjaan harian di lokasi klien, Teknisi Lapangan membuka aplikasi dan langsung mengisi *form daily report* yang mencakup rincian tugas dan persentase penyelesaian (sebagai *Earned Value*).
2. Kalkulasi Data Asinkronus: Data yang disubmit oleh teknisi secara otomatis masuk ke dalam *database*. Di latar belakang, sistem (*backend*) menghitung rasio komparasi *Schedule Performance Index* (SPI) dengan membandingkan progres aktual teknisi terhadap target rencana jadwal (*Planned Value*).
3. Visualisasi *Dashboard* dan EWS: Hasil kalkulasi dari sistem langsung dirender secara visual pada *dashboard* manajer menggunakan *framework* Next.js. Data tekstual diubah menjadi grafik progres dan metrik warna status (EWS).
4. Evaluasi Manajerial: Manajer Proyek membuka *dashboard* dan langsung dapat melihat proyek mana yang berstatus aman (hijau) dan mana yang mengalami keterlambatan atau kritis (merah) secara sekilas, memungkinkan pengambilan tindakan penanganan sedini mungkin.

BAB IV
ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Analisis Sistem

Analisis Sistem adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Analisis sistem biasanya dilakukan dalam membuat *System Design*. *System Design* adalah salah satu langkah dalam teknik pemecahan masalah di mana komponen-komponen pembentuk sistem digabungkan sehingga membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Hasil dari *System Design* merupakan gambaran sistem yang sudah diperbaiki. Teknik dari *System Design* ini meliputi proses penambahan, penghilangan, dan pengubahan komponen-komponen dari sistem semula.

4.2 Analisa Kebutuhan

Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari PT Smart Home Inovasi Yogyakarta terkait pengembangan fitur *dashboard* pemantauan proyek berbasis data *daily report*. Kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu analisa kebutuhan fungsional dan analisa kebutuhan non-fungsional.

4.2.1 Analisa Kebutuhan User

Berdasarkan desentralisasi wewenang pelaporan dan alur proses bisnis yang diusulkan pada PT Smart Home Inovasi Yogyakarta, terdapat dua kategori pengguna utama yang akan berinteraksi langsung dengan sistem pemantauan ini, yaitu Teknisi Lapangan dan Manajer Proyek. Adapun rincian kebutuhan dari masing-masing aktor adalah sebagai berikut:

1. Teknisi Lapangan

   Teknisi Lapangan berperan sebagai pelaksana operasional di lokasi klien, seperti melakukan instalasi perangkat IoT. Dalam sistem ini, teknisi bertindak sebagai sumber utama pencatatan data faktual. Kebutuhan Teknisi Lapangan meliputi:

   - Teknisi dapat melakukan input *Daily Report* mandiri**.** Teknisi dapat mengisi langsung formulir laporan progres harian segera setelah menyelesaikan pengerjaan di lokasi klien, yang mencakup rincian tugas, persentase *Earned Value*, dan catatan kendala operasional tanpa melalui perantara manajer.
   - Teknisi dapat mengakses *Self-Performance Dashboard*. Ini memungkinkan teknisi untuk melihat visualisasi ringkas nilai *Schedule Performance Index* (SPI) pribadi yang dikalkulasi secara otomatis dari akumulasi data laporan harian mereka, guna melakukan swamonitoring status kinerja jadwal secara mandiri (apakah sesuai target, mendahului, atau terlambat).

2. Manajer Proyek

   Manajer Proyek berfungsi sebagai pengawas pada tingkat manajerial yang bertanggung jawab atas kelancaran seluruh portofolio proyek perusahaan. Pada pengembangan sistem ini, Manajer Proyek tidak lagi bertugas menginput laporan secara manual, melainkan bertindak sebagai pengguna utama antarmuka visual. Kebutuhan Manajer Proyek meliputi:

   - Mengakses halaman *dashboard* utama yang memvisualisasikan ringkasan seluruh proyek aktif.
   - Memantau metrik *Project Health Status* yang direpresentasikan melalui indikator visual kode warna (*Red, Amber, Green*) untuk setiap proyek.
   - Melihat perbandingan terperinci antara progres ideal (*Planned Value*) berdasarkan durasi proyek, dengan progres aktual (*Earned Value*) hasil laporan harian.
   - Mengidentifikasi nilai deviasi progres dan membaca catatan kendala teknis terakhir yang dihadapi teknisi.

- Menerima peringatan dini (*Early Warning System*) melalui penonjolan urutan proyek berstatus kritis pada *dashboard*, sehingga dapat segera menentukan prioritas penanganan secara objektif.
- Hak akses Manajer Proyek dibatasi pada pemantauan *dashboard* dan evaluasi kinerja operasional, tanpa wewenang atau kebutuhan untuk mengelola data di luar lingkup *daily report* (seperti data keuangan atau pengadaan material).

4.2.2 Analisa Kebutuhan Fungsional

Analisa kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan, fitur, dan fungsi yang harus disediakan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan alur bisnis perusahaan. Kebutuhan fungsional pada sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Penginputan Data Operasional

   Sistem harus memfasilitasi Teknisi Lapangan untuk melakukan *input* data *daily report* secara langsung, yang mencakup rincian persentase progres pekerjaan harian (*Earned Value*) dan catatan kendala di lapangan.
2. Kalkulasi Matematis Otomatis

   Sistem (*backend*) harus mampu mengakumulasi data mentah dari *daily report* dan melakukan kalkulasi nilai deviasi progres atau *Schedule Performance Index* (SPI) secara otomatis dengan membandingkan progres aktual terhadap target rencana jadwal (*Planned Value*) (Radman dkk., 2025).
3. Pemicu *Early Warning System* (EWS)

   Sistem harus mampu mengkategorikan status kesehatan proyek (*Project Health Status*) secara otomatis ke dalam indikator kode warna *Red-Amber-Green* (RAG) berdasarkan parameter perhitungan SPI (misalnya, berstatus Merah/Kritis jika nilai SPI < 1).
4. Visualisasi *Dashboard* Sentral

   Sistem harus dapat menampilkan antarmuka *dashboard* bagi Manajer Proyek yang menyajikan ringkasan seluruh proyek aktif, mengurutkan proyek berdasarkan tingkat urgensi/kekritisan, serta menampilkan detail berupa progres ideal, progres

Commented [u27]: Radman, K., Jelodar, M., & Lovreglio, R. (2025). RealCONs: A Digital Framework for Construction Reporting Accuracy and Early Delay Detection. *J. Inf. Technol. Constr., 30*, 745-777. https://doi.org/10.36680/j.itcon.2025.031.

aktual, deviasi, dan indikator EWS secara visual tanpa memerlukan penelusuran dokumen tekstual.

4.2.3 Analisa Kebutuhan Non Fungsional

Analisa kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan, standar performa, dan karakteristik operasional yang harus dimiliki oleh sistem. Kebutuhan non-fungsional pada pengembangan sistem ini meliputi:

1. Kinerja (*Performance*):
   Fitur *dashboard* harus mampu merender visualisasi data agregasi dan perubahan status *Early Warning System* secara asinkronus dan *real-time*. Penggunaan *framework* Next.js dengan fitur *Server-Side Rendering* (SSR) diwajibkan agar pembaruan informasi pada *dashboard* dapat berjalan cepat tanpa harus memuat ulang (*refresh*) keseluruhan halaman.
2. Keamanan (*Security*) dan Otorisasi:
   Sistem harus membedakan hak akses secara ketat (*role-based access control*). Teknisi Lapangan hanya memiliki wewenang untuk memasukkan data *daily report*, sedangkan hak akses untuk memantau indikator *dashboard* secara menyeluruh dikhususkan bagi Manajer Proyek.
3. Kegunaan (*Usability*):
   Antarmuka *dashboard* harus dirancang dengan pendekatan visual yang intuitif, sehingga Manajer Proyek dapat mengidentifikasi kondisi kesehatan suatu proyek secara sekilas tanpa membutuhkan proses analitik manual.

4.3 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait model proses menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), model data, struktur fisik basis data, relasi antar tabel, hingga perancangan antarmuka visual yang akan dikembangkan pada fitur *dashboard* pemantauan proyek ini. Proses perancangan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen, mulai dari alur penginputan data *daily report* di lapangan hingga otomasi visualisasi *Early Warning System* (EWS),

dapat saling terintegrasi dengan baik. Hal ini bertujuan agar sistem yang dibangun mampu beroperasi secara akurat dan memenuhi seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari Manajer Proyek dan Teknisi Lapangan di PT Smart Home Inovasi Yogyakarta. Perancangan sistem ini diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa sub-bagian berikut.

4.3.1 Perancangan Model Proses

Perancangan model proses pada pengembangan sistem ini menggunakan *Unified Modeling Language* (UML) untuk memvisualisasikan interaksi antara pengguna (Teknisi Lapangan dan Manajer Proyek), sistem, dan basis data. Penggunaan UML bertujuan memetakan alur transformasi data *daily report* menjadi indikator visual pada *dashboard* secara terstruktur. Pendekatan ini dilakukan untuk meminimalisasi potensi kesalahan implementasi, mempermudah pemahaman logika *Early Warning System* (EWS), serta memastikan seluruh fungsionalitas terintegrasi secara efisien sesuai dengan kebutuhan operasional di PT Smart Home Inovasi Yogyakarta.

4.3.1.1 Model *Use Case Diagram*

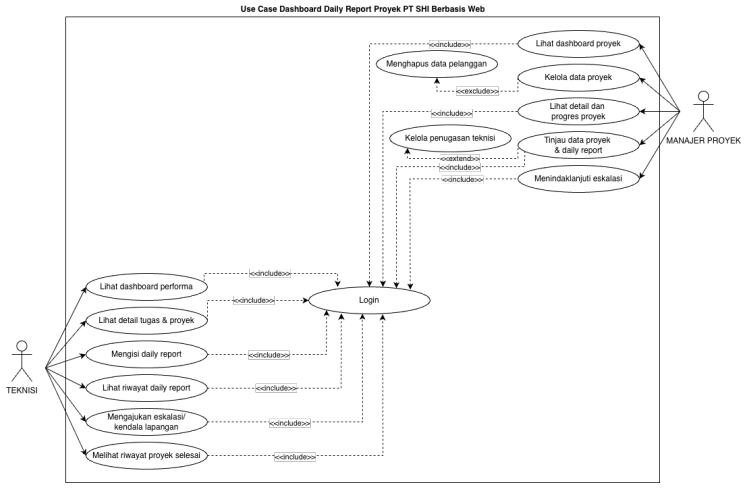

4.3.1.2 Model *Activity Diagram*

1) *Activity Diagram Login* dan *Logout*

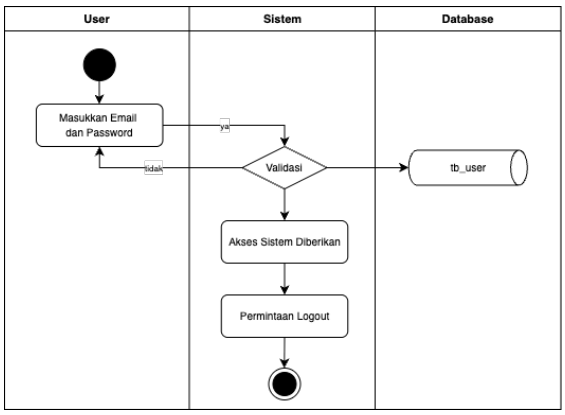

2) *Activity Diagram Daily Report*, Pengisian Progres, & Penilaian Otomatis

3) *Activity Diagram* Kelola Proyek

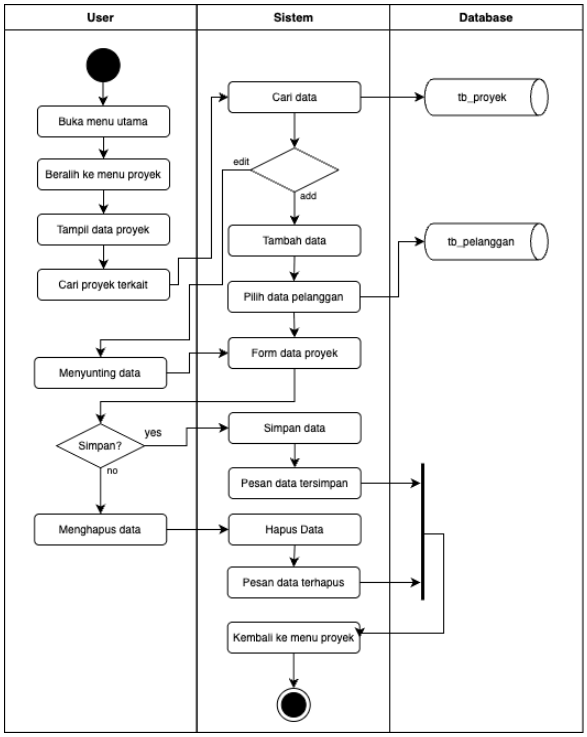

4) ***Activity Diagram*** **Lihat** ***Dashboard*** **Proyek**

5) ***Activity Diagram*** **Lihat** ***Dashboard*** **Performa Teknisi**

6) ***Activity Diagram*** **Menindaklanjuti Eskalasi / Tinjau** ***Daily Report***

4.3.1.3 Model ***Sequence Diagram***

1) ***Sequence Diagram Login*** **dan** ***Logout***
2) ***Sequence Diagram Daily Report*****, Pengisian Progres, & Penilaian Otomatis**
3) ***Sequence Diagram*** **Kelola Proyek**
4) ***Sequence Diagram*** **Lihat** ***Dashboard*** **Proyek**
5) ***Sequence Diagram*** **Lihat** ***Dashboard*** **Performa Teknisi**
6) ***Sequence Diagram*** **Menindaklanjuti Eskalasi / Tinjau** ***Daily Report***

4.3.1.4 Model *Class Diagram*

4.3.2 Perancangan Model Data

4.3.3 Perancangan Fisik Basis Data

4.3.4 Perancangan Relasi Antar Data

4.3.5 Perancangan Antarmuka

4.3.5.1 Antarmuka Data Input

4.3.5.2 Antarmuka Data Proses

4.3.5.3 Antarmuka Data *Output*

4.3.5.4 Antarmuka Navigasi Struktur Data

4.4 Rancangan Anggaran Pengembangan Sistem

BAB V
IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM

5.1 Implementasi

5.1.1 Implementasi Basis Data

5.1.2 ‘Implementasi Sistem

5.2 Pembahasan

5.2.1 Pembahasan Basis Data

5.2.2 Pembahasan Sistem

5.2.3 Pengujian

5.3 Inovasi Sistem

f

BAB VI
PENUTUP

6.1 Simpulan

6.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LOGBOOK TUGAS AKHIR
